

Nueva App Inversiones

Plan de Ikitech al **16 oct 2026** · ClickUp al 16 oct
Sprint 3 (SP1-Q4 en ClickUp) · 5 – 23 oct


Cuenta Digital N4 y Rocket

Construir junto con Ikitech la nueva app de Consubanco para abrir la Cuenta Digital N4 y las cuentas de inversión para menores de edad de Rocket, con fin de desarrollo planeado para el 25 de diciembre de 2026.

Línea base de 18 semanas, del 24 de agosto al 25 de diciembre. Estamos en la semana 2 del Sprint 3 de Ikitech, que en ClickUp corresponde al Sprint 1 del Q4.

70

días para el fin de desarrollo
25 de diciembre de 2026



Habilitadores del banco

Entregables de Consubanco que permiten a Ikitech sostener las fechas del plan.

CSB-DEP-01

● En desarrollo

Nuevas APIs de enrolamiento

Responsable: Raúl Uribe (CSB) · **50%**

Servicios para la apertura y el enrolamiento desde cero. Ya se entregaron las credenciales del ambiente de desarrollo.

Siguiente paso: Publicar las APIs en el ambiente de QA.

CSB-DEP-02

● Requiere atención

Definiciones de Rocket

Responsable: POs de negocio · **50%**

Respuestas a las dudas del 30 de septiembre, 7 y 13 de octubre, y HUs de los flujos posteriores al Home del tutor y al login del menor.

Siguiente paso: Mesa de trabajo de 2 horas con los POs esta semana.

CSB-DEP-03

● Requiere atención

Ambientes en la nube (GCP)

Responsable: Equipo de Cloud CSB · **50%**

Cloud Run, PostgreSQL 17, Secret Manager y certificado SSL para el ambiente de QA.

Siguiente paso: Entregar URLs, secretos y certificado del ambiente de QA.

Avance por proyecto

Avance real reportado por Ikitech al 16 de octubre, por componente técnico y su peso en cada proyecto.

Proyecto 1: Nueva App Inversiones (N4)

Peso 50% del programa · ● En progreso

36.5%

COMPONENTE

Front de los journeys N4

React 19 / Vite

PESO

20%

AVANCE

95%

Textos y recursos dinámicos

Server-Driven UI vía CDN

10%

100%

Integración con Incode

Selfie, INE y prueba de vida

20%

80%

APIs del banco

Core, RENAPO y Secoban

20%

15%

Dashboard y movimientos

Sprint 4

10%

Programado

Simulador de inversiones

Sprint 4

10%

Programado

Aclaraciones con Salesforce

Sprint 5

5%

Programado

Estados de cuenta y constancias

Sprint 6

5%

Programado

Proyecto 2: Ecosistema Rocket

Peso 50% del programa · ● Requiere atención

42%

COMPONENTE

Front del tutor

Onboarding y Home "Mi Tripulación"

PESO

25%

AVANCE

85%

Consola del menor en CDN

Server-Driven UI, temas Espacio y Océano

15%

100%

Integración con Incode

Re-KYC del tutor y biometría

30%

90%

APIs Core ICBS y Salesforce

Integración y QA

30%

10%

Naves y Misiones

Gamificación · Sprints 4 y 5

—

Programado

Puntos de atención

Ambiente de QA en la nube

● Requiere atención

El backend y la integración con las APIs del banco ya están listos en desarrollo. Para pasarlos a pruebas se necesita que el equipo de Cloud habilite el ambiente de QA en GCP con sus URLs, secretos y certificado SSL. Con eso arrancan las pruebas automatizadas de punta a punta y la ejecución de los 145 casos de prueba diseñados.

Definiciones de Rocket

● Requiere atención

Rocket tiene el detalle hasta el Home del tutor y el login de la consola del menor. Para seguir se necesitan los flujos siguientes (movimientos, transferencias, naves, misiones y gamificación) y responder las dudas enviadas el 30 de septiembre, 7 y 13 de octubre. Ikitech propone una mesa de trabajo de 2 horas con los POs; si se resuelve esta semana, el plan se mantiene, y si no, estima un ajuste de 1 a 1.5 sprints.

Front listo, back en marcha

● Foco del sprint

El front de N4 va al 95% y, en ClickUp, 21 de las 23 HUs en desarrollo ya tienen las pantallas terminadas. El enfoque del sprint es el back: conectar esas pantallas con los servicios de Consubanco y los cuestionarios de Rocket.

Actualización de Incode

● En marcha

La nueva versión del SDK de Incode requirió más esfuerzo del previsto; en Rocket ya se subió la versión nueva (14 de octubre). La integración va al 80% en N4 y al 90% en Rocket, donde falta validar las reglas de parentesco y el acta de nacimiento.


Más HUs listas para arrancar

● Listo

Inicio de sesión ya está refinada (HU_AC_006 a 012). Rocket suma seis HUs refinadas: generación de firma y de contraseña en la apertura, y cuatro de la consola del menor (activación con enlace o código, inicio de sesión y recuperación de contraseña).

Roadmap del proyecto

Master gantt de Ikitech: 21 semanas, del Sprint 0 de preparación (3 de agosto) al fin de desarrollo (25 de diciembre de 2026). La semana actual es la W11 (12 al 16 de octubre).

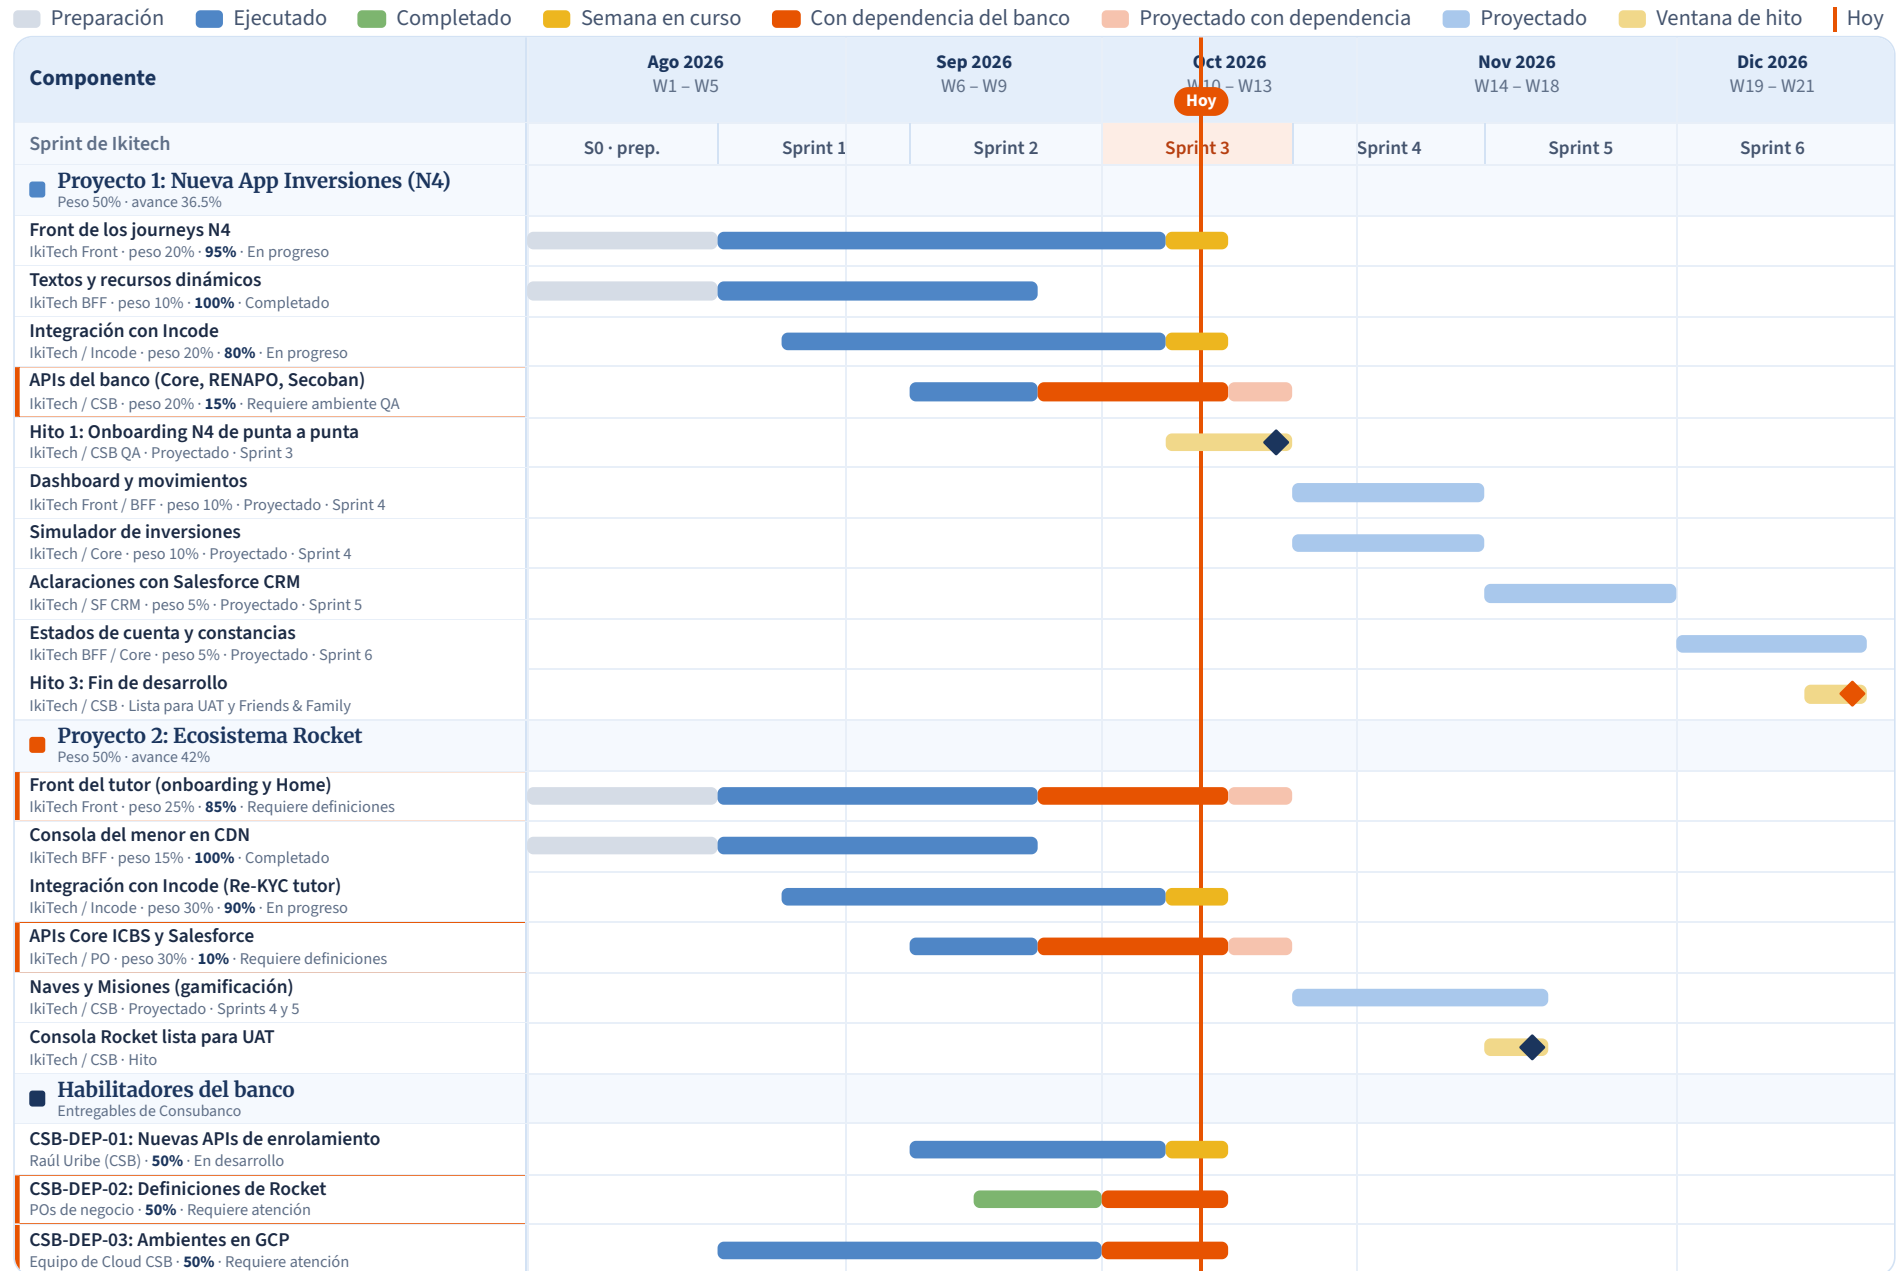

Hitos del plan

11 sep 2026 · realizado Cierre del Sprint 1 Contenedor Flutter y PWA listos; inicio del mapeo de APIs	2 oct 2026 · realizado Cierre del Sprint 2 Review aprobado al 100% con reconocimiento a la calidad visual	23 oct 2026 Hito 1: Onboarding N4 Enrolamiento N4 de punta a punta (Sprint 3)	13 nov 2026 Hito 2: Simulador y Consola Rocket Simulador de inversiones y consola web del menor (Sprint 4)	4 dic 2026 Prueba de desempeño 500 solicitudes por segundo con respuesta p95 de 900 ms o menos (Sprint 5)	25 dic 2026 Hito 3: Fin de desarrollo App lista para UAT y Friends & Family (Sprint 6)
---	--	--	--	---	---

Plan por sprint

Alcance de cada sprint de Ikitech y su equivalente en ClickUp.

Sprint	ClickUp	Nueva App Inversiones (N4)	Ecosistema Rocket	Hito
Sprint 0 3 – 21 ago	Pre-fase	- Base de la app en Flutter y documento de arquitectura (SAD v3.0) - Diseño UI/UX en Figma y maquetación de pantallas básicas	Maquetación inicial del onboarding y landings con datos de prueba	● Completado Preparación (no suma al avance)
Sprint 1 24 ago – 11 sep	SP3-Q3	- Migración a React 19 / Vite y contenedor Flutter - Pruebas de concepto y pruebas con API Connect	- Onboarding de Rocket migrado a React 19 - Datos de prueba	● Completado Contenedor y PWA cerrados; inicio del mapeo de APIs
Sprint 2 14 sep – 2 oct	SP4-Q3	- Enrolamiento desde cero (PWA al 85%) - Integración con Incode (40%) - Análisis de APIs con Raúl Uribe	- Onboarding de Rocket (70%) - Biometría con Incode (30%) - Mesa de trabajo de 5 vacíos	● Completado Review aprobado al 100%
Sprint 3 5 – 23 oct	SP1-Q4	- Bienvenida y enrolamiento N4 de punta a punta - Inicio de sesión con CURP y bloqueos (AD y CRM) - Temporizador del código SMS (90 s), Incode 2.0 y ruta alterna Karalundi	- Varios menores por tutor: “Mi Tripulación” - Regla SPEI en el Core ICBS y parentesco - Consola web del menor en CDN	● En curso Hito 1: Onboarding N4 y muestra ejecutiva (13 oct)
Sprint 4 26 oct – 13 nov	SP2-Q4	- Simulador de inversiones interactivo con tasas del Core ICBS - Dashboard con saldo que se puede ocultar	- Consola web del menor en la nube (React 19) - Temas Espacio y Océano; Naves	● Programado Hito 2: Simulador y Consola Rocket
Sprint 5 16 nov – 4 dic	SP3-Q4	- Aclaraciones integradas con Salesforce CRM - Pruebas de carga: 500 solicitudes por segundo (p95 ≤ 900 ms)	Conexión con el Core ICBS para Misiones y Naves de ahorro con recompensas	● Programado Prueba de desempeño y carga en GCP
Sprint 6 7 – 25 dic	SP4-Q4	- Firma de contratos con Incode (NOM-151) - Regresión automatizada sin errores	Fin de desarrollo; lista para UAT y Friends & Family	● Programado Hito 3: Fin de desarrollo


Avance por historia de usuario

Avance funcional por HU con datos de ClickUp al 16 de octubre. Complementa el avance técnico por componente que reporta Ikitech.

Resumen de avance

27%

avance general



48%

avance promedio de las 23
HUs en desarrollo

21 de 23

HUs en desarrollo con el
front terminado

40% · 14%

front · back terminados en
todo el alcance

9 completadas

23 en desarrollo

18 refinadas

11 por refinar

14 en backlog

Cómo se mide. Cada HU en desarrollo se divide en dos partes del mismo peso: **front** (pantallas, 50%) y **back** (servicios e integración, 50%). Solo suma lo terminado. Una HU completada cuenta 100% y una por iniciar, 0%.

Cómo leer este avance

Avance técnico (Ikitech)

Mide cada componente de la solución (front, servicios, Incode, APIs del banco) según su peso en el proyecto. Es la cifra oficial del plan: Nueva App Inversiones al 36.5% y Ecosistema Rocket al 42%.

Avance por HU (ClickUp)

Mide cuántas historias de usuario del alcance completo ya están terminadas, incluidas las que aún no inician. Por eso avanza más lento al principio, baja cuando entran HUs nuevas al alcance y acelera cuando se conecta el back.

Siguiente salto

Al cerrar el back de las 23 HUs en desarrollo, el avance por HU pasa de 27% a 43%. Por eso el ambiente de QA y las APIs del banco son clave en este sprint.

Avance por épica

■ HUs completadas ■ Front terminado (HUs en desarrollo) ■ Back terminado (HUs en desarrollo) ■ Por avanzar

Experiencia		100%
Completadas 7/7		
Onboarding		39%
Completadas 1/7 · Front listo 3/3 · Back listo 0/3 · Por iniciar: 1 por refinar · 2 en backlog		
Inicio de sesión		0%
Por iniciar: refinadas 7 · por refinar 0 · backlog 0		
Cuenta Digital N4		24%
Completadas 1/16 · Front listo 5/7 · Back listo 0/7 · Por iniciar: 2 refinadas · 1 por refinar · 5 en backlog		
Rocket		33%
Completadas 0/20 · Front listo 13/13 · Back listo 0/13 · Por iniciar: 5 refinadas · 1 por refinar · 1 en backlog		
Manejo cuenta Rocket		0%
Por iniciar: refinadas 0 · por refinar 3 · backlog 5		
Consola Rocket		0%
Por iniciar: refinadas 4 · por refinar 0 · backlog 1		
Cimentación técnica		0%
Por iniciar: refinadas 0 · por refinar 5 · backlog 0		

Sprint 3 · SP1-Q4

Alcance comprometido por Ikitech

Nueva App Inversiones (N4)

- Bienvenida y enrolamiento N4 de punta a punta
- Inicio de sesión con CURP
- Bloqueos en inicio de sesión (AD y CRM)
- Temporizador de 90 segundos para el código SMS
- Incode 2.0
- Ruta alterna (fallback) Karalundi

Ecosistema Rocket

- Varios menores por tutor: “Mi Tripulación”
- Regla SPEI en el Core ICBS (sin transferencias a terceros)
- Guardar el parentesco para su seguimiento
- Consola web del menor publicada en CDN

Completada En curso Programada Cierre del sprint Hoy

Actividad	Semana 1 · W10		Semana 2 · W11	Semana 3 · W12
	5 – 9 oct		12 – 16 oct	19 – 23 oct
Cuenta Digital N4 De punta a punta				
Back de captura de datos y bienvenida				
Back de INE y confirmación de datos				
Domicilio y vulnerabilidad				
Rocket Apertura para menores				
Back de cuestionarios PLD				
Datos del adulto, domicilio y acta				
Calidad QA				
Ejecución de casos, sprints 2 a 4				
Reporte de cierre de pruebas				
Habilitadores del banco Consubanco				
Ambiente de QA en GCP				
Mesa de trabajo de definiciones Rocket				
Definición PO y negocio				
Inicio de sesión refinada				
Priorizar alcance del Sprint 4				
Cierre y Hito 1 Onboarding N4 de punta a punta · 23 oct				

Hitos del sprint

5 oct 2026 · realizado Arranque del Sprint 3 Foco en el back de N4 y Rocket	13 oct 2026 Muestra ejecutiva Onboarding N4	23 oct 2026 Cierre y Hito 1 Onboarding N4 de punta a punta	26 oct 2026 Arranque del Sprint 4 Simulador de inversiones y Consola Rocket
---	---	--	---

Entregado y equipo

Entregado

- 14 oct** Front del acta de nacimiento del menor terminado (HU0038) y nueva versión del SDK de Incode
 - **Rocket** 14 oct
- 7 oct** HU_N4_003 completada: validación del código SMS; términos y condiciones y servicio de revisión del teléfono en listas de riesgo
 - **N4** 2 – 7 oct
- 7 oct** Pantallas de domicilio y datos de la INE; front de los cuestionarios de Rocket terminado
 - **N4 y Rocket** 2 – 7 oct
- 2 oct** Cierre del Sprint 2 con review aprobado al 100% y reconocimiento a la calidad visual de las pantallas (pixel-perfect)
 - **Sprint** 2 oct
- 2 oct** Las 7 HUs de experiencia completadas: principios, accesibilidad, sistema de diseño, estados, nativo + PWA y navegación
 - **Experiencia** 2 oct
- 1 oct** Conexión con Incode para validar identidad, retomar el flujo si se interrumpe, lectura automática de la INE y envío del código SMS
 - **N4 servicios** 1 oct

- 30 sep** Firma electrónica, acta de nacimiento del menor, ocupación, origen de recursos, PEP, saldo promedio y atención asistida
 - **Rocket** 28 – 30 sep
- 30 sep** Pantalla de carga unificada, memoria de datos entre pantallas y navegación de regreso en N4
 - **App** 28 – 30 sep
- 25 sep** Textos y recursos visuales dinámicos al 100% (Server-Driven UI): se actualizan desde la nube sin publicar otra versión; temas Espacio y Océano de la consola del menor
 - **N4 y Rocket** Sep
- 23 sep** Primeros 5 casos de prueba ejecutados (bienvenida)
 - **Calidad** 23 sep
- 11 sep** Cierre del Sprint 1: contenedor Flutter y PWA listos; inicio del mapeo de APIs
 - **Sprint** 11 sep
- 11 sep** Base de la app en Flutter conectada con los flujos en React; pruebas de concepto de tecnología, concurrencia, Incode y sistema de diseño
 - **Arquitectura** 1 – 11 sep

- 11 sep** Manejo de sesión segura y servicios de contenidos administrables
 - **Servicios** 1 – 11 sep
- 11 sep** Pantallas de código SMS, contrato, correo, contraseña, confirmación, información fiscal, límite diario y cuestionario financiero
 - **N4 y Rocket** 1 – 11 sep
- 25 ago** HU_AC_001 Acceso a la plataforma y permisos: primera HU completa
 - **Onboarding** 25 ago
- 21 ago** Splash, permisos nativos (notificaciones y ubicación), carrusel de beneficios y pantalla de acceso con las 3 opciones
 - **Onboarding** 20 – 21 ago
- 21 ago** Bienvenida, requisitos, beneficios, términos y aviso de privacidad con consentimiento, fecha, hora y geolocalización; visor de PDF
 - **N4** 20 – 21 ago
- 21 ago** Componentes de formulario, alertas y estilos compartidos
 - **Base** 20 – 21 ago

Actividades del equipo

Front y base de la app Dev05

Entregado

Base de la app, onboarding; Rocket: cuestionarios PLD, firma (28–30 sep) y acta de nacimiento (14 oct); pantalla de carga unificada

En curso

Rocket: documentación y firma (HU0040)

Front Dev02

Entregado

Código SMS, contrato, contraseña y confirmación de N4 y Rocket (11 sep); pantallas de domicilio y datos de la INE

En curso

N4 datos de la INE (HU_N4_005) y domicilio (HU_N4_008); Rocket HU0029 y HU0030

Servicios e integraciones Dev04

Entregado

Sesión segura; Incode y lectura de la INE (1 oct); servicio de revisión del teléfono en listas de riesgo; nueva versión del SDK de Incode en Rocket (14 oct)

En curso

Back de Rocket y cuestionarios; integración con la revisión del teléfono; servicio Consubanco

Servicios y contenidos Dev03

Entregado

Contenidos administrables; envío y validación del código SMS; términos y condiciones (oct)

En curso

Mapeo de integraciones de N4; multimedia

Calidad (QA) Dev01

Entregado

145 casos de prueba diseñados; primeros casos ejecutados en bienvenida

En curso

Casos de prueba de los sprints 2 y 3 listos para ejecutar en QA

Detalle por historia de usuario

Etapa y avance de cada HU. El avance considera front y back con el mismo peso.

HU	Nombre	Épica	Etapa	Avance	Equipo	Comentario
EXP-001	Principios rectores de la experiencia	Experiencia	● Completada	100% · Completada		Completada el 2 oct
EXP-002	Principios UX de implementación	Experiencia	● Completada	100% · Completada		Completada el 2 oct
EXP-003	Accesibilidad	Experiencia	● Completada	100% · Completada		Completada el 2 oct
EXP-004	Sistema de diseño y design tokens	Experiencia	● Completada	100% · Completada		Base técnica de design tokens entregada
EXP-005	Gestión de estados	Experiencia	● Completada	100% · Completada		Completada el 2 oct
EXP-006	Experiencia continua (nativo + PWA)	Experiencia	● Completada	100% · Completada		Completada el 2 oct
EXP-007	Arquitectura de información y navegación	Experiencia	● Completada	100% · Completada		Completada el 2 oct
HU_AC_001	Acceso a la plataforma y permisos	Onboarding	● Completada	100% · Completada	Dev05	Entregada el 25 ago
HU_AC_002	Bienvenida a la aplicación (beneficios)	Onboarding	● En progreso	75% · Front listo · Back en curso	Dev05 · Dev03	Front listo; integración de contenidos en curso
HU_AC_003	Inicio de sesión (acceso directo)	Onboarding	● En progreso	50% · Front listo · Back pendiente	Dev02 · Dev04	Integración con servicio Consubanco en curso
HU_AC_004	Autenticación biométrica	Onboarding	● En progreso	50% · Front listo · Back pendiente		
HU_AC_005	Gestión de sesión	Onboarding	● Por refinar	—	Dev02 · Dev04	Se reprograma; el manejo de sesión segura ya está entregado
HU012	Acceso recurrente	Onboarding	● En backlog	—		
—	Manejo de acceso y excepciones	Onboarding	● En backlog	—		
HU_AC_006	Pantalla de bienvenida y ruteo inicial	Inicio de sesión	● Refinada, por iniciar	—		
HU_AC_007	Login: teléfono, contraseña y dispositivo	Inicio de sesión	● Refinada, por iniciar	—		
HU_AC_008	Bloqueos en inicio de sesión (AD y CRM)	Inicio de sesión	● Refinada, por iniciar	—		
HU_AC_009	Recuperar contraseña	Inicio de sesión	● Refinada, por iniciar	—		

HU	Nombre	Épica	Etapas	Avance	Equipo	Comentario
HU_AC_010	Migración de cliente existente vía CURP	Inicio de sesión	● Refinada, por iniciar	—		
HU_AC_011	Registro nuevo — verificación de productos	Inicio de sesión	● Refinada, por iniciar	—		
HU_AC_012	Enrolamiento cliente con productos	Inicio de sesión	● Refinada, por iniciar	—		
HU_N4_001	Bienvenida y beneficios apertura	Cuenta Digital N4	● En progreso	0% · Front en curso · Back pendiente	Dev05 · Dev03	Front y contenidos listos; integración en curso
HU_N4_002	Captura de datos de contacto	Cuenta Digital N4	● En progreso	50% · Front listo · Back en curso	Dev02 · Dev03 · Dev04	Revisión del teléfono del cliente en listas de riesgo, en curso
HU_N4_003	Verificación de teléfono con OTP	Cuenta Digital N4	● Completada	100% · Completada	Dev02 · Dev03 · Dev04	Envío y validación del código SMS completados
HU_N4_004	Captura y validación de INE	Cuenta Digital N4	● En progreso	40% · Front en curso · Back en curso	Dev04	Conexión con Incode y lectura automática de la INE entregadas (1 oct)
HU_N4_005	Confirmación de datos del INE	Cuenta Digital N4	● En progreso	50% · Front listo · Back pendiente	Dev02	
HU_N4_006	Verificación de CURP ante RENAPO	Cuenta Digital N4	● Refinada, por iniciar	—		
HU_N4_007	Validación biométrica (selfie y prueba de vida)	Cuenta Digital N4	● Refinada, por iniciar	—		
HU_N4_008	Confirmación y actualización de domicilio	Cuenta Digital N4	● En progreso	50% · Front listo · Back pendiente	Dev02	
HU_N4_009	Información fiscal y listas negras	Cuenta Digital N4	● Por refinar	—		Pantalla fiscal ya construida
HU_N4_010	Información laboral	Cuenta Digital N4	● En backlog	—		
HU0018	Información financiera y uso de la cuenta	Cuenta Digital N4	● En backlog	—		Pantalla de cuestionario ya construida
HU_N4_10	Cuestionario de vulnerabilidad	Cuenta Digital N4	● En progreso	50% · Front listo · Back pendiente	Dev04	
HU0020	Documentos de contratación y correo	Cuenta Digital N4	● En progreso	50% · Front listo · Back en curso	Dev02 · Dev05	Flujo cliente nuevo: documentos y firma
HU0021	Elegibilidad regulatoria y unicidad de cuenta	Cuenta Digital N4	● En backlog	—		
HU0022	Firma del contrato de apertura	Cuenta Digital N4	● En backlog	—		Componente de firma ya adaptado a N4
HU0023	Creación de contraseña y confirmación	Cuenta Digital N4	● En backlog	—		Pantallas ya construidas

HU	Nombre	Épica	Etap	Avance	Equipo	Comentario
HU0024	Landing: información general y requisitos	Rocket	● En progreso	50% · Front listo · Back pendiente	Dev02 · Dev03	
HU0025	Datos de contacto / identificación cliente	Rocket	● En progreso	50% · Front listo · Back pendiente	Dev05	
HU0026	Código de confirmación	Rocket	● Refinada, por iniciar	—	Dev04	
HU0027	Instrucciones INE anverso/reverso	Rocket	● Refinada, por iniciar	—	Dev02 · Dev04	
HU0028	Validación identidad adulto	Rocket	● Por refinar	—		
HU0029	Confirmación datos adulto (extracción INE)	Rocket	● En progreso	50% · Front listo · Back pendiente	Dev02 · Dev04 · Dev05	
HU0030	Confirmación y actualización de domicilio	Rocket	● En progreso	50% · Front listo · Back pendiente	Dev02	
HU0031	Ocupación laboral	Rocket	● En progreso	50% · Front listo · Back pendiente	Dev05	
HU0032	Origen de recursos	Rocket	● En progreso	50% · Front listo · Back pendiente	Dev05	
HU0033	Uso de la cuenta	Rocket	● En progreso	50% · Front listo · Back pendiente	Dev05	
HU0034	Uso de los recursos	Rocket	● En progreso	50% · Front listo · Back pendiente	Dev05	
HU0035	Cargo en el gobierno (PEP)	Rocket	● En progreso	50% · Front listo · Back pendiente	Dev05	
HU0036	Saldo promedio de depósito	Rocket	● En progreso	50% · Front listo · Back pendiente	Dev05	
HU0037	Cuestionario de vulnerabilidad	Rocket	● En progreso	50% · Front listo · Back pendiente	Dev05	
HU0038	Acta de nacimiento del menor	Rocket	● En progreso	50% · Front listo · Back pendiente	Dev05	Front terminado el 14 oct
HU0039	Si es cliente: documentación y OTP	Rocket	● Refinada, por iniciar	—	Dev02	
HU0040	No es cliente: documentación y firma	Rocket	● En progreso	50% · Front listo · Back pendiente	Dev05	
HU0041	Generación de firma	Rocket	● Refinada, por iniciar	—		Nueva HU, refinada
HU0042	Generación de contraseña	Rocket	● Refinada, por iniciar	—		Nueva HU, refinada
—	Mapeo de expediente y envío a backoffice	Rocket	● En backlog	—		

HU	Nombre	Épica	Etapas	Avance	Equipo	Comentario
HU0043	Home de la cuenta Rocket	Manejo cuenta Rocket	● Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0044	Generación de accesos a la consola desde la app	Manejo cuenta Rocket	● Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0045	Consulta de “Mi Tripulación” y administración de accesos	Manejo cuenta Rocket	● Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
—	Visualización de movimientos	Manejo cuenta Rocket	● En backlog	—		
—	Fondeo a la cuenta	Manejo cuenta Rocket	● En backlog	—		
—	Naves de ahorro	Manejo cuenta Rocket	● En backlog	—		
—	Inversiones	Manejo cuenta Rocket	● En backlog	—		
—	Visualización estado de cuenta	Manejo cuenta Rocket	● En backlog	—		
HU0046	Activación de cuenta del menor con enlace de acceso	Consola Rocket	● Refinada, por iniciar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0047	Activación de cuenta del menor con código de acceso	Consola Rocket	● Refinada, por iniciar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0048	Inicio de sesión en la consola	Consola Rocket	● Refinada, por iniciar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0049	Recuperación de contraseña en la consola	Consola Rocket	● Refinada, por iniciar	—		Nueva HU en ClickUp
—	Consola Rocket: reglas generales	Consola Rocket	● En backlog	—		
HU-T01	Contratos API-First y mocks (BFF)	Cimentación técnica	● Por refinar	—		
HU-T02	Scaffolding, CI/CD y calidad de código	Cimentación técnica	● Por refinar	—		
HU-T03	PoC capa anticorrupción (SOAP→JSON)	Cimentación técnica	● Por refinar	—		
HU-T04	Scaffolding app móvil y performance	Cimentación técnica	● Por refinar	—		

HU	Nombre	Épica	Etapas	Avance	Equipo	Comentario
HU-T05	Seguridad base (IdP / API Gateway)	Cimentación técnica	● Por refinar	—		

Fuentes: Master Gantt 360° y roadmap de Ikitech (16 de octubre de 2026), ClickUp del espacio CSB-Ikitech y backlog de épicas de la Nueva App Inversiones (16 de octubre de 2026). El avance por HU pondera front 50% y back 50%. Product Owner: Martín Nieto.
